


PREVENTIVI PERMBLEDHES I PUNIMEVE

ANEKSI 1

Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	CERNALEV	CERNALEVA-1	ORESHKE	BORJE	TOTALI
I	PUNIME CIVILE	70403256	76771926	113923782	30458358	
1	Vepra e marrjes	Leke 3195612	3458574	4303152	2706354	
2	Dekantuesi	Leke 2042964	2351034	3138912	1391166	
3	Kanali i derivacionit	Leke 23953860	30242520	44278920	9337230	
4	Baseni i presionit	Leke 2755494	2847852	3819690	1582938	
5	Tubacioni i turbinave	Leke 26377470	24588270	43637580	9028530	
6	Ndertesa e centralit	Leke 12077856	13283676	14745528	6421140	
	SHUMA 1	Leke 70403256	76771926	113923782	30458358	
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE					
	Hydroelektrike dhe linja TN	Leke 118800000	138080000	201080000	52800000	
	SHUMA 2	Leke 118800000	138080000	201080000	52800000	
III	SHPRONSIME					
	SHUMA 3	Leke 2000000	2360000	2920000	1300000	
IV	PROJEKTI					
	SHUMA 4	Leke 4800000	4800000	6000000	3600000	
	SHUMA 1+2+3+4	Leke 196003256	222011926	323923782	88158358	830097322

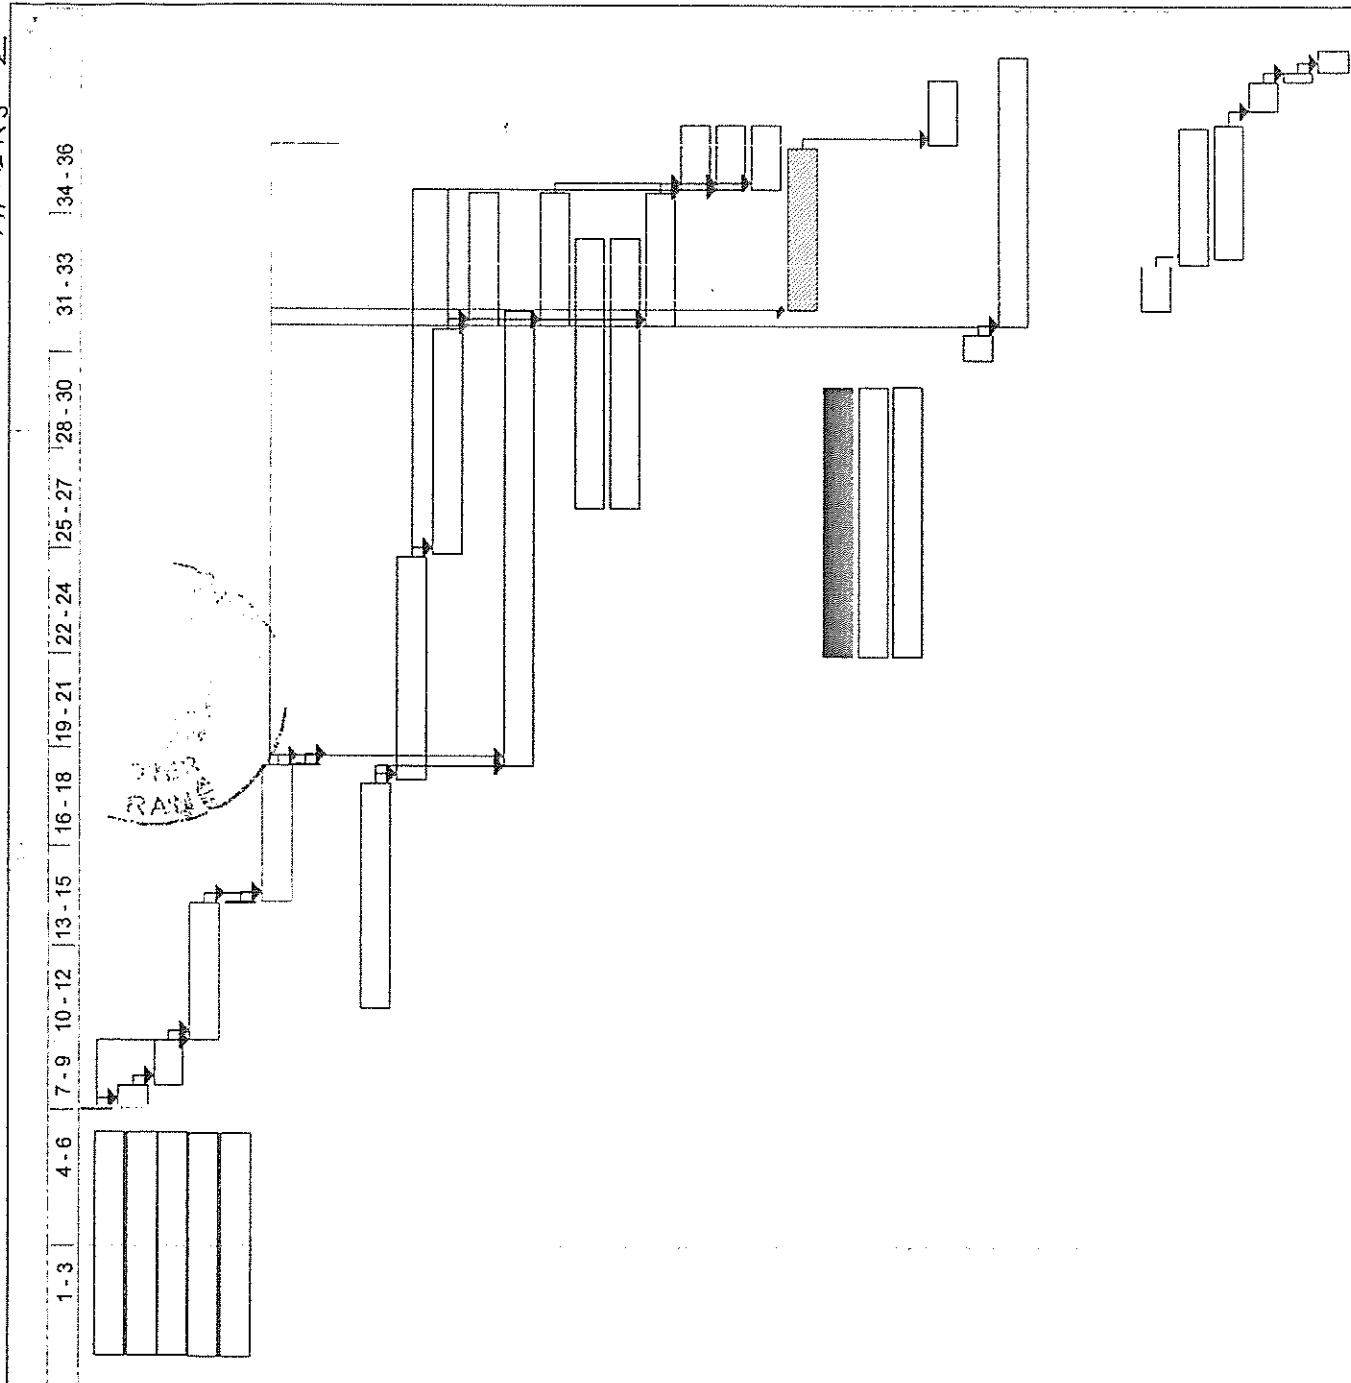

ID	Task Name
1	Fillimi i projektit
2	Inspektimi i objektit
3	Studimi i stabilitetit
4	Përgatitja e specifikimeve teknike të projektit
5	Ekuiviteti i kontrolit
6	Projektimi, prodhimi dhe transporti i pajisjeve
7	Fillimi i ndërimit të Hec në objekt
8	Punime civile
9	Vepra e merrjes dhe dëgja
10	Kanali i drejtimit
11	Bazenti dhe tubacioni i presionit
12	Godina e centralit dhe shkarkuesi
13	Punime hidromekanike
14	Turbina
15	Instalimi i turbinave
16	Dhoma sipërore, tubat shkarkuesi
17	Pjesët ndihmëse hidromekanike
18	Instalimi i tubacionit të presionit
19	Instalimi i drasëve dhe i varcënësve
20	Instalimi i pajisjeve hidromekanike në bazen
21	Punime elektrike
22	Gjeneratori
23	Instalimi i gjeneratorit
24	Instalimi i paneleve elektrike të gjeneratorit
25	Instalimi i transformatorit
26	Pjesë ndihmëse elektrike
27	Sistemi i kontrollit të Hec - II
28	Instalimi i sistemit të kontrollit
29	Instalimi i kontrollit lokal KL - I
30	Instalimi i kontrollit lokal KL - 2
31	Instalimi i pajisjeve hidrologjike
32	Instalimi i celave, shkarkuesve, shkarkuesve
33	Kontrolli i linjës elektrike
34	Kaloqimi dhe testimi i Hec dhe linjës
35	Veria në punë e Hec - II
36	Udhëja me rrethinë e sipërdorjes të KESH dhe

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

CERIFIKATE GARANCIE KONTRATE

Nr.012699

Per : **MINISTRINE e EKONOMISE,TREGETISE dhe ENERGJETIKES**
Blv.Deshmoret e Kombit,1001,Tirane

Duke qene se Bashkimi i Perkoheshem „HYDROALBANIA „ Shpk ,FERATI Shpk,EURO-ALBA-EA Shpk , perfaqesuar nga Shoqeria „HYDROALBANIA „ Shpk me seli ne Kukes , perfaqesuar nga z.Dylber DOGJANI , Administrator,perfaqesuar me prokure te posacme nr.3777Rep,nr.1881/2 Kol.date 23.08.08 ,ka marre persiper ne baze te Kontrates, Referenca nr.008.01.068 te realizoje :

Projektimi ,Ndertimi,Shfrytezimi dhe Transferimi i hidrocentraleve ne lumin Borje/Kukes , tek Autoriteti Kontraktues,Ref.nr. 008.01.068

Duke qene se ne Kontrate si me siper kerkohet nje Garanci ne shumen prej 83,009,732lek(tetedhjetetremiljonenentemijeeshateqindetridhjetedylek),si sigurim per permbushjen e detyrimeve te parashikuara ne kontrate.

Duke qene se SIGMA Sha eshte Garantues i Kontrates se mesiperme deri ne shumen totale prej 83,009,732lek(tetedhjetetremiljonenentemijeeshateqindetridhjetedylek), e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne Kontrate.

Ne marrim persiper t'i paguajme “Ministrise se Ekonomise ,Tregetise dhe Energjetikes”,Tirane sapo sapo te beje kerkesen e pare me shkrim per cdo shkak te mundshem, te matshem, te provueshem,te paparashikur, te ligjshem dhe jashte kontrollit te paleve ,cdo shume brenda kufirit prej 83,009,732lek(tetedhjetetremiljonenentemijeeshateqindetridhjetedylek).
Me kete Garanci ju sigurojme se nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare HYDROALBANIA „ Shpk per te realizuar pagesen sipas kerkeses tuaj.

Deklarojme se asnje shtese apo ndryshim i kushteve te kontrates per te cilen ju mund te bini dakord me kontaktuesin nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie.

Kjo Cerifikate Garancie eshte e vlefshme nga data 25.03.09.deris 24.03.2010,duke u rinovuar cdo vit ,deri ne daten 25.03.2012 qe kerkohet nga Autoriteti Kontraktor,me kerkesen e Autoritetit Kontraktor ose shoqeria HYDROALBANIA „ Shpk .

Leshuar ne Tirane me 25.03. 2009 ne perputhje me Autorizimin nr.1 ,date 03.02.1996,leshuar nga Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve,bazuar ne dispozitat e Ligjit nr.9267,date 29.07.2004“Per vepriktarine e Sigurimeve dhe Risigurimeve“

SIGURUESI

SIGMA Sha

Qemal/DISHA

Drejtor i Pergjithshem

I SIGURUARI

HYDROALBANIA Shpk
